




Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano

Gaudio di Lavello

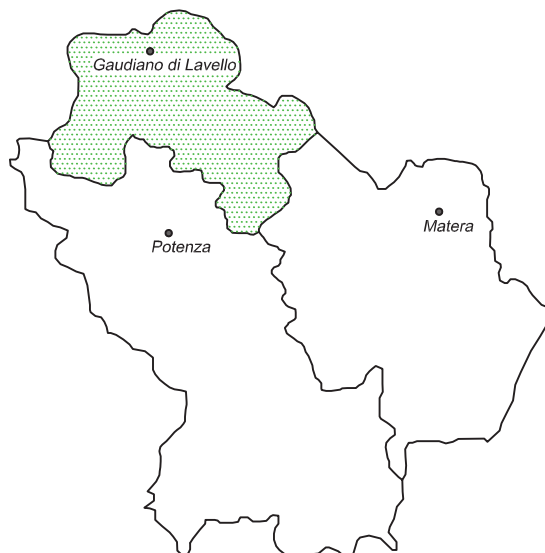

PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
Sottomisura 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E RECUPERO DELL'EFFICIENZA
DELLE RETI IRRIGUE E BACINI DI ACCUMULO ESISTENTI NEI
COMUNI DI LAVELLO - MELFI - MONTEMILONE E DEL VULTURE

TAV.	PROGETTO ESECUTIVO	DATA
C.8.2		Maggio 2017
SCALA		AGG. Luglio 2017 Luglio 2019
	Cronoprogramma delle forniture II° Lotto forniture	AGG. Genn. 2020

IL PROGETTISTA

geom. Carlo M. Carretta

Firmato digitalmente da

CARLO MAURO CARRETTA

CN = CARRETTA CARLO

MAURO

O = non presente

C = IT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Marianna Marchitelli

Firmato digitalmente da

Marianna Marchitelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Giuseppe P. Musacchio

CN = Marchitelli Marianna

attività lavorative	inizio	durata	fine
FORNITURA IDROMETRI	01/07/2020	300	27/04/2021
SMONTAGGIO SARACINESCHE E FLANGE ESISTENTI	01/07/2020	119	28/10/2020
POSA IN OPERA IDROMETRI	05/08/2020	49	23/09/2020
POSA IN OPERA IDROMETRI	04/11/2020	49	23/12/2020
POSA IN OPERA IDROMETRI	03/02/2021	49	24/03/2021
POSA IN OPERA IDROMETRI	05/05/2021	49	23/06/2021
PROVE DI FUNZIONAMENTO NUOVO SISTEMA IRRIGUO	24/03/2021	99	01/07/2021
TOTALE APPALTO	01/07/2020	365	01/07/2021

